

prezentace **ŘSD**

Ing. Marek Novotný

ŘSD ČR, Správa Hradec Králové



**Stav realizace a přípravy dálnice D11 v
Královéhradeckém kraji na území České
republiky**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Realizované stavební úseky D11

- 1106 Hradec Králové – Smiřice,
- 1107 Smiřice – Jaroměř.

Připravované stavební úseky D11

- 1108 Jaroměř – Trutnov,
- 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR



D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice



D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice

- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 15,460 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Eurovia – Metrostav – Swietelsky
- Smluvní cena: 2, 594 mld. Kč bez DPH

Realizace stavby:

- Zahájení realizace stavby: 10/2018
- Zprovoznění stavby: dle dodatku ke smlouvě - 12/2021
- Práce probíhají dle harmonogramu, žádný ze stavebních objektů není v tuto chvíli na kritické cestě.
- Většina přeložek inženýrských sítí je dokončena.
- Příprava realizace žlabů curb-king.
- U většiny mostů je provedena nosná konstrukce.




D11, 1106 Hradec Králové – Smiřice

Realizace stavby:

- Byly dokončeny a zprovozněny tyto SO (Dohody o předčasném užívání):
 - SO 111 (MÚK Plotišť, větev 1 – pravý jízdní pás, větev 11 – km 0,320 – 0,690),
 - SO 133 (zkapacitnění silnice I/35 – pravý jízdní pás),
 - SO 130 (přeložka silnice III/32438) a
 - SO 220 (Most na silnici III/32438).



D11, 1107 Smiřice – Jaroměř

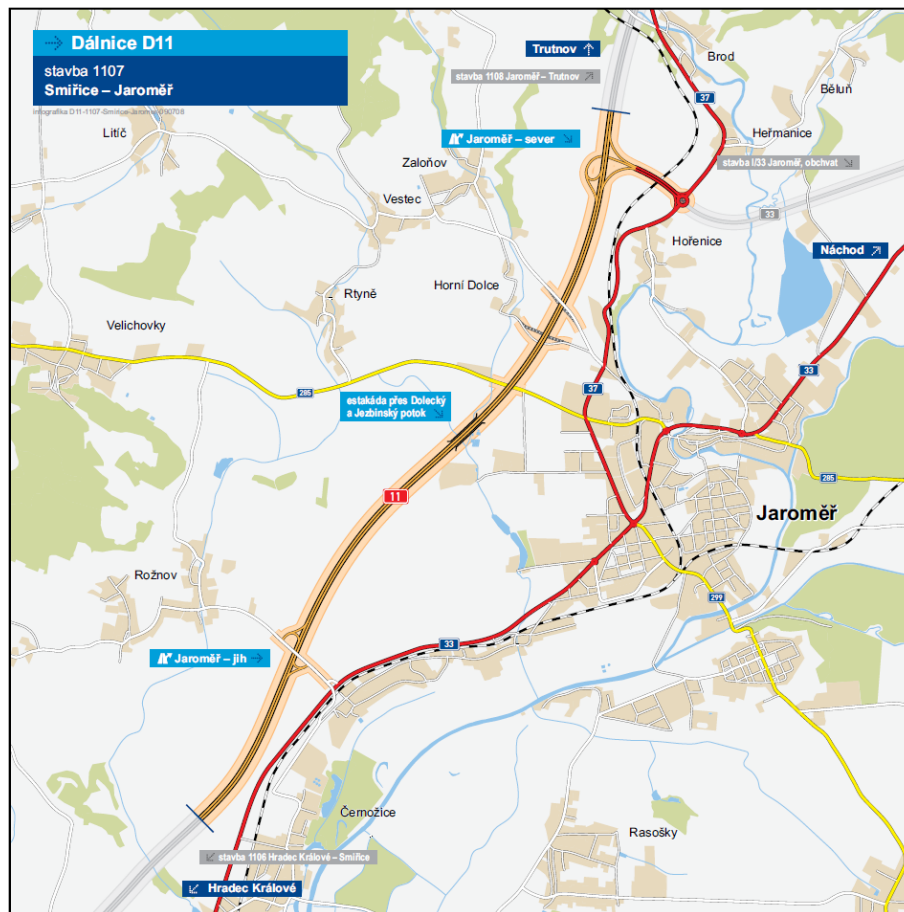

D11, 1107 Smiřice – Jaroměř

- Kategorie: D 27,5/120
- Délka úseku: 7,390 km (v úseku 2x MÚK)
- Zhotovitel: Sdružení Porr Bau Gmbh a Porr a.s.
- Smluvní cena: 1, 498 mld. Kč bez DPH

Realizace stavby:

- Zahájení realizace stavby: 04/2018
- Zprovoznění stavby: 12/2021
- Práce probíhají dle harmonogramu. Probíhají přípravné práce pro pokládku příkopových žlabů.
- Jsou dokončeny spodní stavby u většiny mostů.
- Jsou dokončovány přechodové oblasti mostů a gabionové stěny.
- Probíhá montáž sloupků a pohltivých panelů protihlukových stěn.





D11, 1108 Jaroměř – Trutnov


- Kategorie: D 26,0/120
- Délka úseku: 19,630 km (v úseku 2x MÚK, 1 tunel)
- Předpokládané náklady stavby: 11, 972 mld. Kč bez DPH

Příprava stavby:

- Vydáno stanovisko EIA podle zák. č. 100/2001 Sb., jehož platnost byla prodloužena, vydáno Závazné ověřovací stanovisko EIA.
- Zpracován předběžný geotechnický průzkum a dokumentace DÚR.
- Podání žádosti o ÚR v 09/2018, v 02/2021 oznámení o zahájení ÚR, VP 26.3.2021.
- Probíhá monitoring podzemních vod, zpracován podrobný GTP, odevzdán koncept DSP a jsou zpracovány připomínky ŘSD ke konceptu DSP. Čistopis DSP bude vyhotoven po vydání ÚR v PM.
- Předpokládaný termín realizace: 2024 – 2027.



D11, 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR

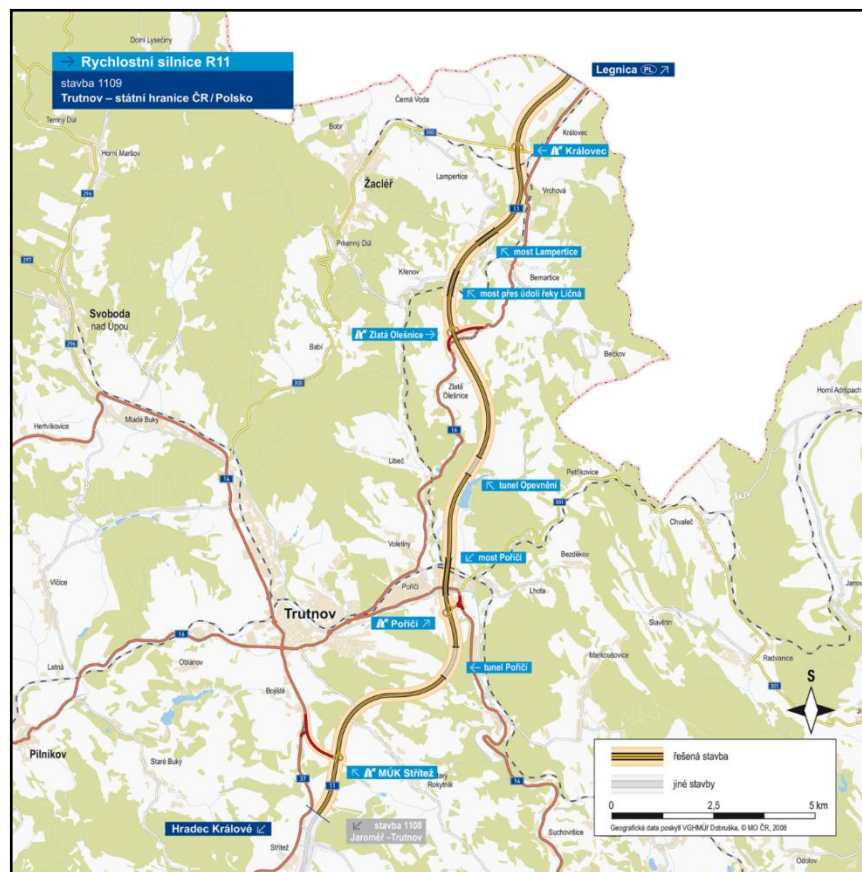

D11, 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR

- Kategorie: D 26,0/130 a D 21,5/110
- Délka úseku: 21,175 km (v úseku 3x MÚK, 2 tunely)
- Náklady stavby: 13, 381 mld. Kč bez DPH

Příprava stavby:

- Vydáno stanovisko EIA podle zák. č. 100/2001 Sb. a závazné ověřovací stanovisko EIA. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stanoviska EIA.
- Zpracován předběžný geotechnický průzkum a dokumentace DÚR.
- V 12/2019 bylo vydáno ÚR, v PM od 01/2020 s dobou platnosti 5 let.
- Probíhá monitoring podzemních vod, byl zpracován podrobný GTP, čistopis DSP vč. ZE a probíhá IČ pro SP.
- V 10/2020 byly zahájeny výkupy pozemků.
- Je podepsána sml. na zpracování doplňujícího GTP a bude probíhat soutěž na zpracování PDPS.
- Předpokládaný termín realizace: 2023 – 2026



SSÚD Střítež

Příprava stavby:

- Centrální komise v 04/2018 schválila záměr projektu.
- Byl zpracován podrobný GTP, dokumentace DÚR, probíhá IČ pro ÚR a v 04/2021 bude podána žádost o ÚR
- Předpokládané náklady vč. areálu dálničního oddělení PČR: 445 mil. Kč bez DPH.
- Předpoklad realizace: 2023 - 2026



Děkuji za pozornost.

Ing. Marek Novotný

Ředitel ŘSD ČR, Správa Hradec Králové

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

E-mail: marek.novotny@rsd.cz





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
